2.13 *NELLE TRAVI DI COPERTURA (di displuvio o di compluvio) INSERIRE STAFFE DI IRRIGIDIMENTO PER EVITARE LO SCHIACCIAMENTO DELLA TRAVE STESSA IN FASE DI LAVORO*

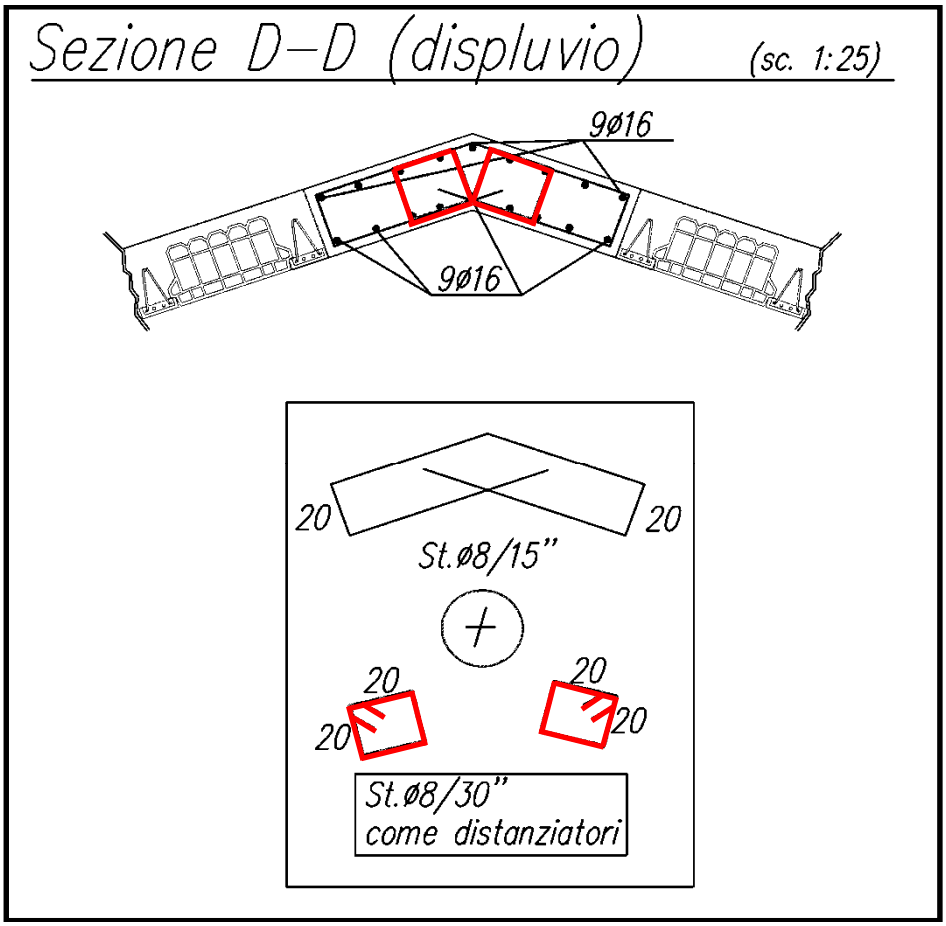

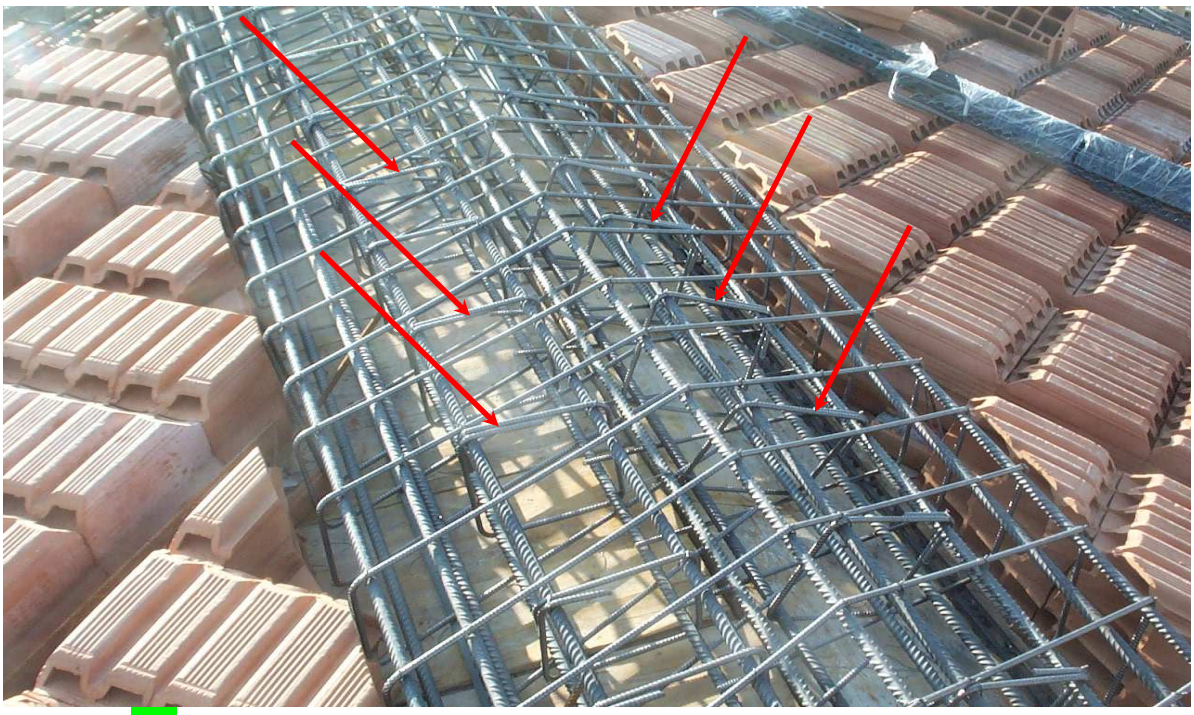

(40) **SI** – Sono state inserite staffe di irrigidimento; questo accorgimento ha impedito lo schiacciamento della trave in fase di lavorazione.
